


STADSFORUM FASE 2, HERINRICHTING- FASERING

Legenda werkvakken en verkeersstromen	Legenda maatregelen
<ul style="list-style-type: none"> Werkvak - verhardingen Werkvak derden (kabels en leidingen / archeologie) Werkvak - riool Werkvak - aanleg bypass Bypass 	<ul style="list-style-type: none"> Bestaande oversteek Nieuwe oversteek Faseknip (bereikbaarheid voetgangersgebied) Tijdelijke VRI knooppunt Bouwmeesterplein Tijdelijke VRI knooppunt Piusstraat Tijdelijke VRI kruispunt veilige oversteek Tijdelijke oversteek Laad/los locatie (centrum)
<ul style="list-style-type: none"> Gemotoriseerd verkeer (en OV en hulpdiensten) Voetgangers / Fietsers Nood- en hulpdiensten Buslijn 	


Fase 1: Aanbrengen riool & K&L en archeologie Oude Markt 3 weken (8 jan - 28 jan 2024)

Alle gemotoriseerde verkeer op zuidelijke rijstrook (zie detail 1) - Bisschop Zwijssenstraat open voor busdienst - Fietsers (twee richtingen) op zuidelijk fietspad - Geen omleidingen

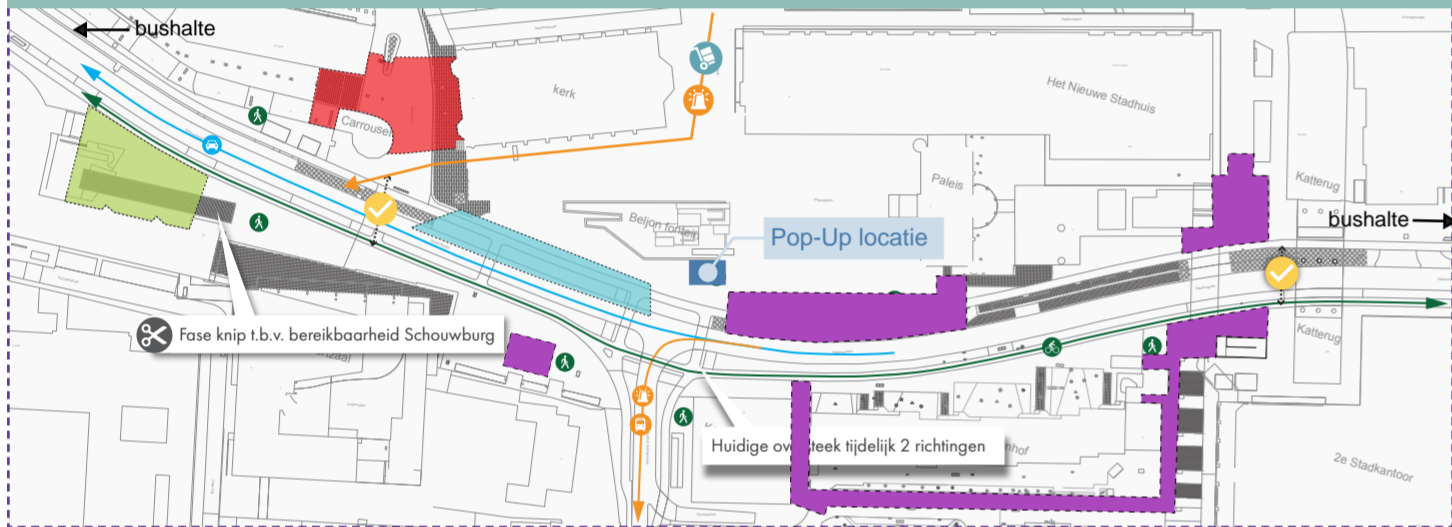

Fase 2: Aanleggen bypass & natuursteen Oude Markt 2 weken (29 jan - 11 feb 2024)

Alle gemotoriseerde verkeer op zuidelijke rijstrook - Bisschop Zwijssenstraat open voor busdienst - Fietsers (twee richtingen) op zuidelijk fietspad - Geen omleidingen

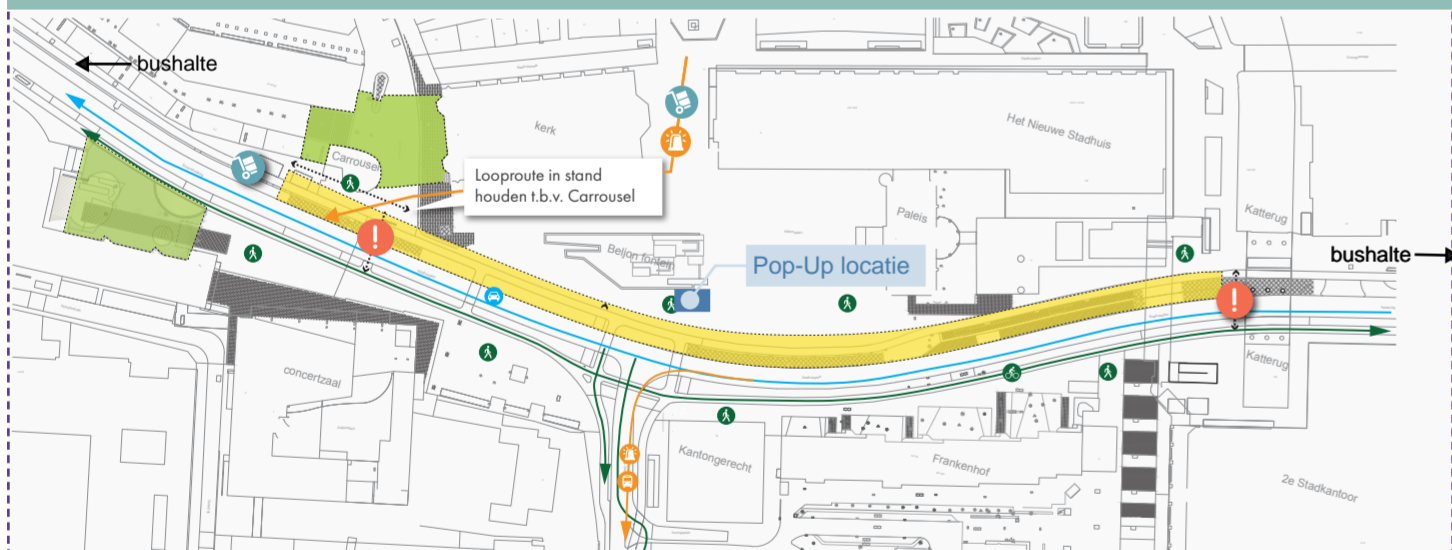

Fase 3: Opbreken rijbaan, aanleg infiltratie en natuursteen zuid 8 weken (12 feb - 7 apr 2024)

Alle verkeer op bypass (zie detail 2) - Bisschop Zwijssenstraat open voor busdienst - Voetgangersgebied noord vrij - Voetgangersgebied zuid deels vrij t.b.v. bereikbaarheid Koningsplein, Schouwburg, Concertzaal en Frankenhof




Fase 4: Natuursteen rijbanen en voetpaden (deel 2) zuid 5 weken (8 apr - 10 mei 2024)

Alle verkeer op bypass (zie detail 2) - Bisschop Zwijssenstraat open voor busdienst - Voetgangersgebied noord vrij - Voetgangersgebied zuid deels vrij t.b.v. bereikbaarheid Koningsplein, Schouwburg, Concertzaal en Frankenhof



Fase 5: Afsluiting: riolering Bisschop Zwijssenstraat en onder Katterug 2 weken (11 mei - 26 mei 2024)

Afsluiting voor autoverkeer (uitzondering voor busdienst en hulpdiensten) - Omleiding voor fietsverkeer - Omleiding voor autoverkeer

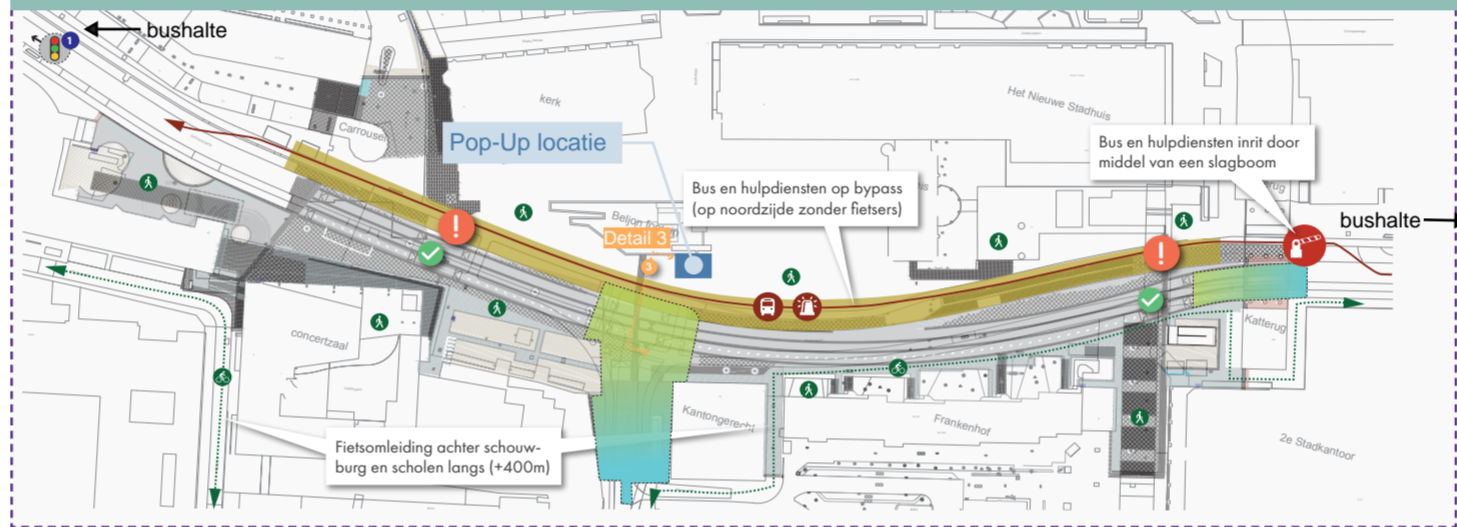


Fase 6: Opruimen bypass, aanbrengen riool oostelijk en natuursteen westelijk pleindeel 4 weken (27 mei - 23 jun 2024)

Uitvoering plein met instandhouding van voetgangersoversteeken - Autoverkeer op nieuwe rijbaan - Fietsverkeer op nieuwe rijbaan.




Fase 7: Aanbrengen natuursteen oostelijk pleindeel 3 weken (23 jun - 12 jul 2024)

Uitvoering plein met instandhouding van voetgangersoversteeken - Autoverkeer op nieuwe rijbaan - Fietsverkeer op nieuwe rijbaan.

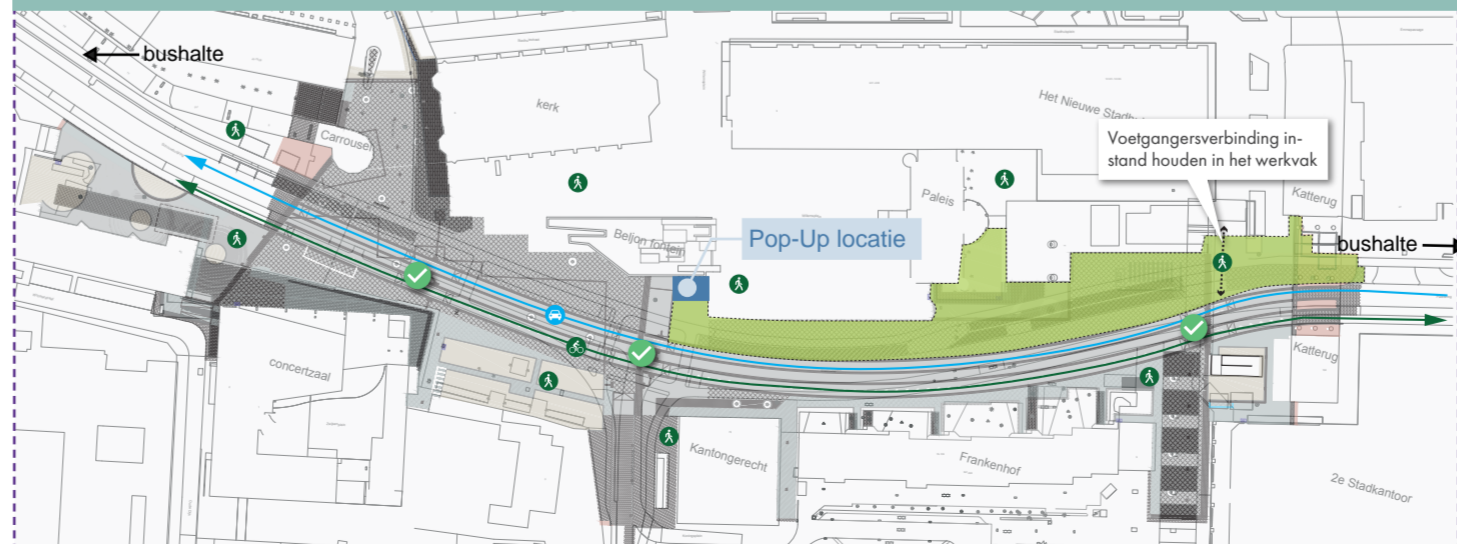

Detail 2: Bypass fase 3 en 4

- ▶ Autoverkeer, busverkeer en hulpdiensten
- ▶ Fietsers in twee richtingen

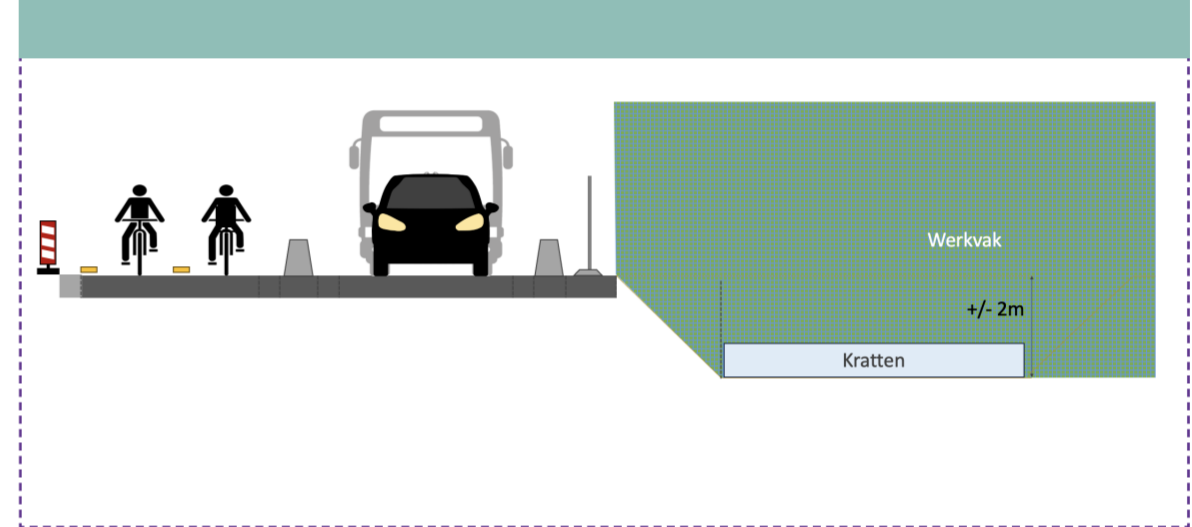

Detail 3: Bypass fase 5 (afsluiting)

- ▶ Busverkeer en hulpdiensten
- ▶ Omleiding fietsers

